


Prosjektplan

Campus Hallingdal

forprosjekt

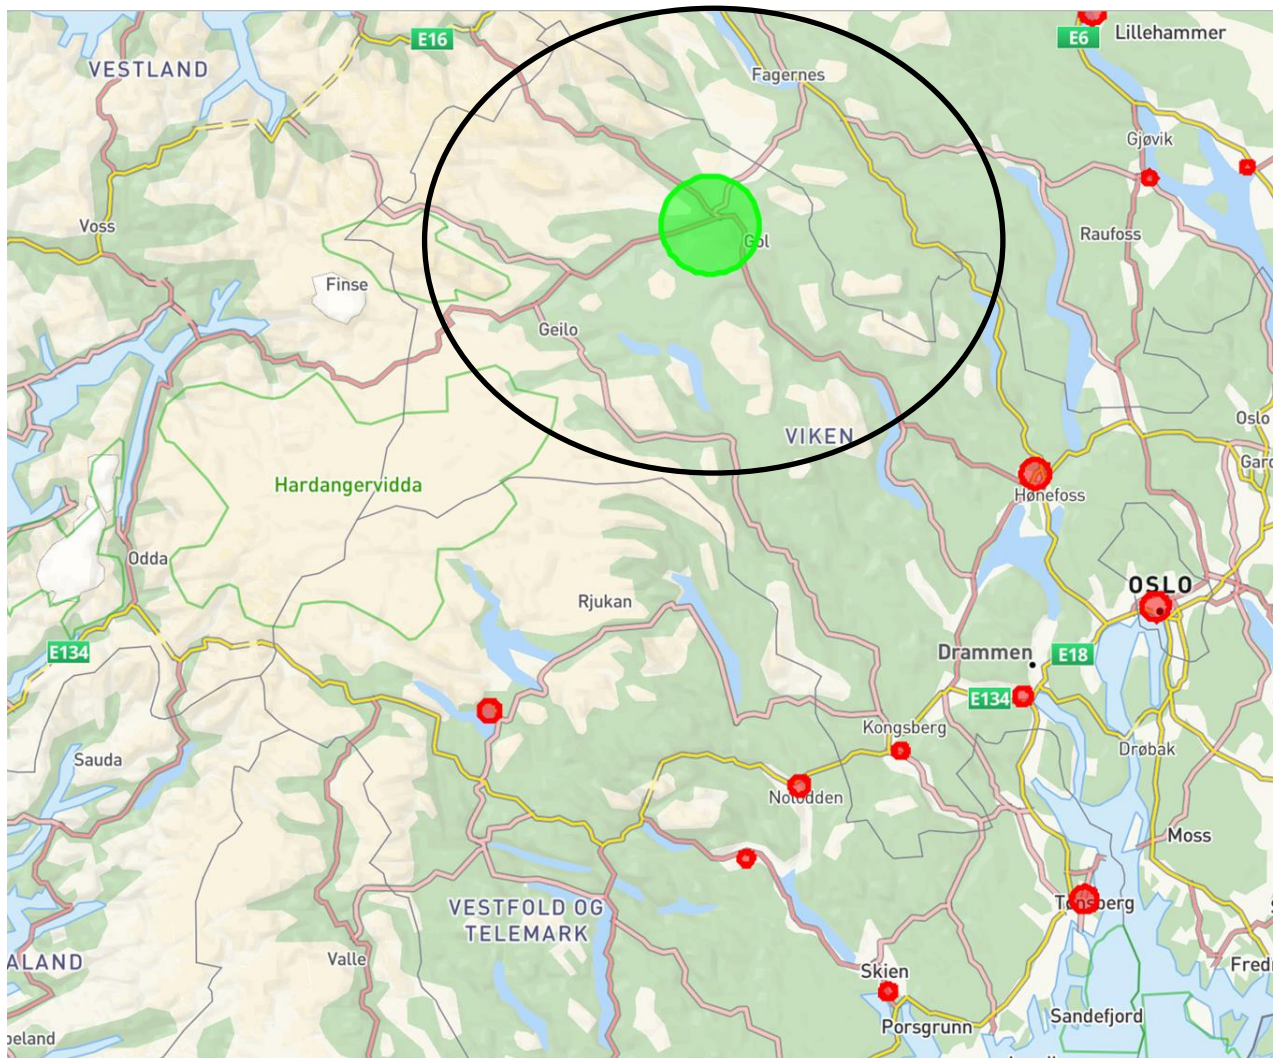

Innholdsfortegnelse

1. Mål og rammer	3
1.1 Bakgrunn	3
1.2 Effektmål	3
1.3 Resultatmål for aktuell fase.....	3
1.4 Rammer og avgrensning.....	3
2. Prosjektorganisasjon	4
3. Prosjektoppfølgning	5
3.1 Beslutningspunkt.....	5
3.2 Statusrapportering	5
3.3 Milepælar	5
4. Målgrupper, interessentar og kommunikasjonsstrategi.....	5
5. Risikovurdering.....	5
6. Gjennomføring	6
6.1 Hovudaktivitetar.....	6
6.2 Tids- og ressursplaner	6
7. Økonomi	6
8. Kontraktar og avtalar.....	7

Kort beskrivelse av prosjektet:

Regionrådet for Hallingdal, Gol kommune og Universitetet i Sørøst-Norge (USN) har starta eit arbeid med målsetting å utvikle eit fleircampuskonsept i Hallingdal.

På nasjonalt nivå har det skjedd ei radikal endring, der det no er politisk vilje og nasjonale føringar for å auke tilgangen til fleksible og desentraliserte utdanningstilbod for høgare utdanning, i heile landet. Hallingdal grip sjansen og vil gjennom eit forprosjekt avklare mogelegheitsrommet.

1. Mål og rammer

1.1 Bakgrunn

Hallingdal fekk aldri ei distriktshøgskule noko som i mange samanhengar har vore peika på som ei ulempe, i forhold til å ha ein ekstra motor i distriktsutviklinga. Når ein ser på distriktskommunar som i si tid «fekk» ei distriktshøgskule så kan det ikkje vera tvil om at dette har vore til gode for distriktskommunar og regionar, m.a. i forhold til regional utvikling.

Eit campus i Hallingdal vil både gje nødvendig nye tilbod, men og skapa arbeidsplassar og auke attraktiviteten ikkje minst for ein yngre del av befolkninga.

Alle analysar og statistikk syner at Hallingdal treng eit meir variert næringsliv for å redusere sårbarheit og for å ta del i nye framtidsretta næringar.

1.2 Effektmål

Den langsiktig effekten av tiltaket er å få etablert Campus Hallingdal, som vil underbygge Hallingdal som ein meir komplett region.

Kva Campus Hallingdal vil kunne bli på sikt er nesten umogeleg å talfeste i denne fasen.

Campus Bø har i dag ca. 2400 studentar og ca. 250 tilsette.

1.3 Resultatmål for aktuell fase

Hovudmålet med forprosjektet er å greie ut moglegheitene for å utvikle og styrke utdanning, forskning, innovasjon og heilskapleg samfunnsutvikling i Hallingdal. Intensjonen er å utvikle og etablere ein campus i Hallingdal, med Gol kommune som vertskommune.

Forprosjektet skal danne grunnlaget for eit hovudprosjekt/etableringsprosjekt.

1.4 Rammer og avgrensning

Tre-parts samarbeidet Regionrådet for Hallingdal, Gol kommune som vertskommune og USN har i forprosjektet som mandat å avklare moglegheitene og premissane for å utvikle eit fleircampuskonsept i Hallingdal, sentralt i Fjellnoreg, som skal tene heile landet i tillegg til å møte regionen sine kompetansebehov. Innbyggjarar, arbeids- og næringsliv vil bli invitert med i dialog og aktiv deltaking i utvikling av Campus Hallingdal til eit inspirerende og relevant utdannings-, forskings- og innovasjonsmiljø i Hallingdal.

Som grunnlag for eit Campus Hallingdal er permanent nærvær, som skal ta hand om

studiekvalitet, livslang læring og kunnskapsbasert regional utvikling avgjerande.

Det er viktig å peike på at satsinga er avhengig av at regjeringa sine ambisjonar om å sikre finansieringsgrunnlaget for ein desentralisert høgare utdanningsstruktur gjennom fleircampusinstitusjonar står ved lag.

Arbeidsoppgåver i forprosjektet:

- Etablere samarbeidsplattforma for tre-part samarbeidet USN, Regionrådet for Hallingdal og Gol kommune
- Arbeid mot sentrale styresmakter for å sikre finansieringsgrunnlaget for ein desentralisert høgare utdanningsstruktur, gjennom fleircampusinstitusjonar
- Forankring lokalt, regionalt, nasjonalt
- Involvere strategiske samarbeidspartnarar lokalt, regionalt, nasjonalt
- Koordinering med andre utviklingsprosjekt
- Interessentanalyse
- Kommunikasjonsstrategi
- Marknadsføring i tidleg fase
- Avklare campuskonsept; fysisk og digital infrastruktur, arealbehov, eventuell bruk av eksisterande bygningsmasse, ny bygningsmasse
- Risikovurdering
- Kartlegging av kompetanse- og kunnskapsbehov og nærare vurdering av potensialet for campus i fjell Norge
- Studietur(ar)
- Sluttrapport som grunnlag for eit hovudprosjekt/etableringsprosjekt

Forprosjektet skal avsluttast innan 1.6.2023.

Den største kostanden er prosjektleiing, der det er føresett at denne ressursen skal gjera ein del konkrete arbeidsoppgåver i forprosjektet. Løyvde midlar til prosjektet er kr. 800.000. I tillegg kjem ein betydeleg eigeninnsats frå partane.

2. Prosjektorganisasjon

Prosjekteigarar: Regionrådet for Hallingdal, Gol kommune, Universitetet i Sørøst-Norge

Oppdragsgjevar: Regionrådet for Hallingdal

Prosjektansvarlig (PA): Ordførarar Gol kommune, Heidi Granli (utnemnt av oppdragsgjevar)

Prosjektleder (PL): Blir engasjert av PA

Styringsgruppe: Representantar frå prosjekteigarar

Prosjektgruppe: Engasjerast og leiaast av prosjektleiar

Referansegruppe (event):

3. Prosjektoppfølgning

3.1 Beslutningspunkt

- 29.8.2022 Godkjenning av prosjektplan
- 1.9.2022 Oppstart forprosjekt
- 1.6.2023 Avslutning, godkjenning forprosjekt

Andre beslutningspunkt kan bli lagt til dersom det oppstår behov for dette.

3.2 Statusrapportering

Prosjektgruppa skal ha månedlege møter (fysisk/teams).

PA rapportera til styringsgruppa som har møte annan kvar måned.

3.3 Milepælar

Må avklarast ved oppstart av prosjektet

4. Målgrupper, interessentar og kommunikasjonsstrategi

Interessentanalyse og kommunikasjonsstrategi er lagt inn som arbeidsoppgåver i prosjektplanen.

5. Risikovurdering

I dette prosjektet (denne fasen) er statleg finansiering av fleircampus-modell ein vesentleg kritiske risikofaktor.

Hending	Sannsynlighet (S)	Konsekvens (K)	Risikofaktor (S x K)	Tiltak
Statleg finansiering	3	5	15	Arbeid mot sentrale styresmakter
Potensialet for campus (studentar)	2	5	10	Marknadsføring i tidleg fase
Fråvær av ressurspersonar	1	5	5	Breitt samansett gruppe, der andre kan overta rollen som leiande i prosessen
Lokalitetar	1	5	5	Vurdere alternativ
Prosjekteigar(ar) trekkjer seg	1	5	5	Gode prosessar

6. Gjennomføring

6.1 Hovudaktivitetar

Hovudaktivitet	Hensikt	Viktige deloppgaver	Resultat
Etablere samarbeidsplattforma for tre-part samarbeidet			
Arbeid mot sentrale styresmakter	Sikre finansiering		
Forankring, involvering			
Kartlegging kompetansebehov, studentar			
Avklare arealbehov, bygningsmasse			
Kommunikasjonsstrategi, marknadsføring			
Studietur			
Sluttrapport			

6.2 Tids- og ressursplaner

Tids- og ressursplan vil vera ei hovudoppgåve å klarleggje i oppstart av prosjektet, ut frå dei økonomiske og menneskeleg ressursar som er stilt til rådvelde.

7. Økonomi

Stipulerte kostnader.

Kostnader		Finansiering	
Kostnadsart	Beløp	Finansieringstype og kjelde	Beløp
Prosjektleiing (70%)	550.000	*	550.000
Kartlegging potensiale studentar	100.000	*	100.000
Møteverksemd	20.000	*	20.000
Utarbeide relevant materiell	50.000	*	50.000
Marknadsføring tidleg fase	50.000	*	50.000
Studietur	30.000	*	30.000
Sum	800.000	Sum	800.000

Finansiering:

- Regionrådet for Hallingdal kr. 200.000
- Gol kommune, kr. 400.000
- Sats på Hallingdal, kr. 200.000

Det er berekna at prosjekteigarane dekkjer egne kostandar til reise/møter og tilsvarande.

8. Kontraktar og avtalar

Det er ingått eigen intensjonsavtale mellom Regionrådet for Hallingdal, Gol kommune og Universitetet i Sørøst-Norge, dat. 16.8.2022.
